



SKG Technology JSC
Software development company

品質管理 プロジェクト管理 セキュリティー情報管理

2025年01月

管理方法

エスケーテクノロジー株式会社は、


- ① **品質管理 (QMS)**: 国際規格 ISO9001 の認証を取得し、品質管理システムを構築。
- ② **プロジェクト管理**: CMMIレベル3 を適用し、認証取得を予定。
- ③ **セキュリティ管理 (ISMS)**: 国際規格 ISO27001 の認証を取得し、情報セキュリティ管理システムを構築。



品質管理



品質管理システム

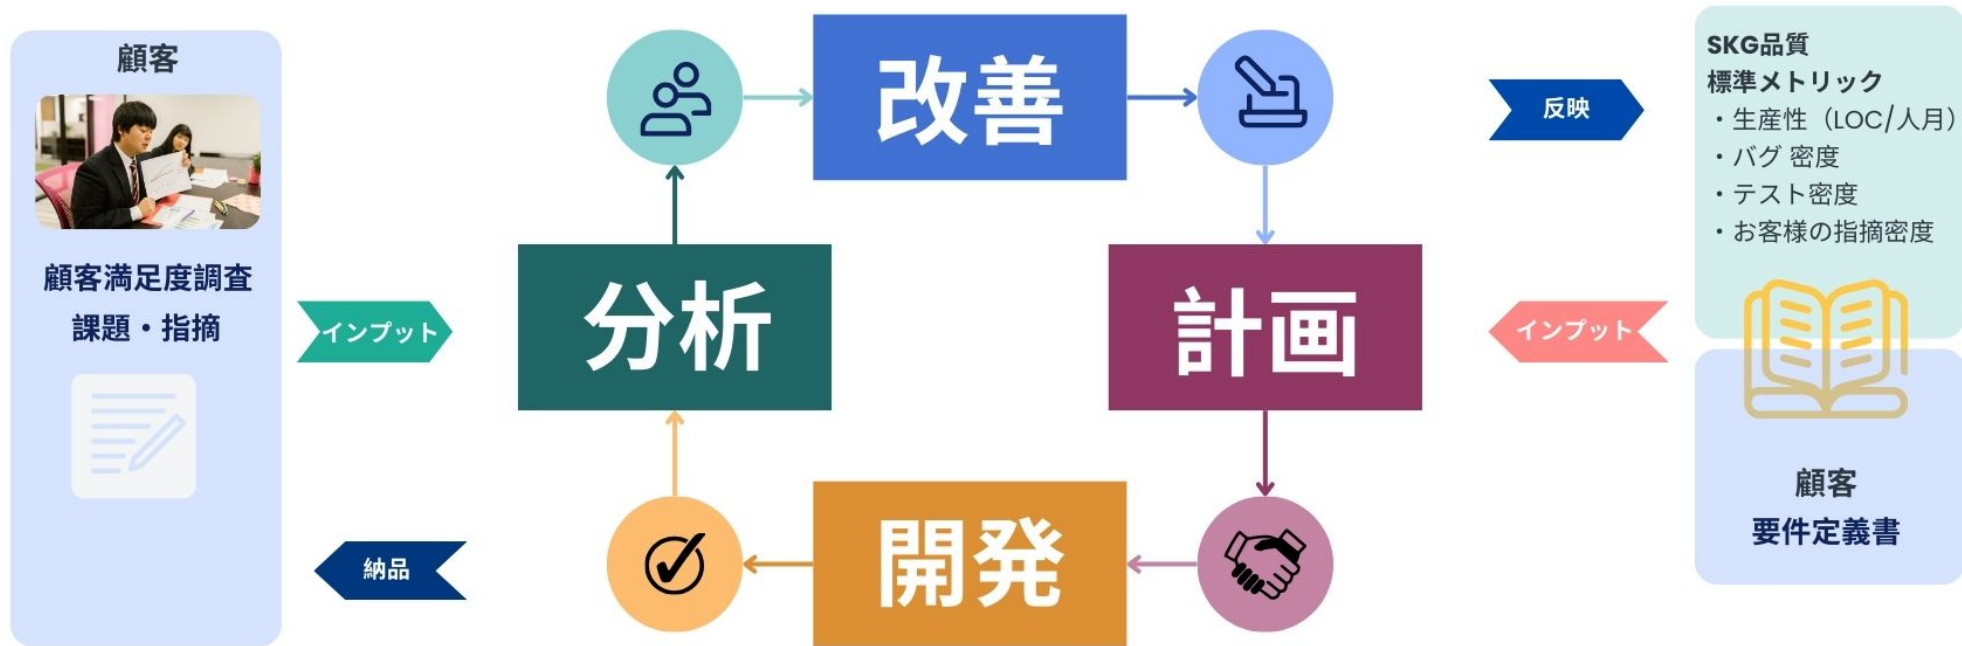

ISO9001に基づくSKGの品質マネジメントを構築する。

品質管理（計画）

顧客要件に基づき、各モジュール・画面単位で品質計画を策定。
SKG品質標準メトリックを活用し、プロジェクト全体の品質目標を統合・管理します。



品質管理（計画）

#	機能	画面ID	画面名	規模（LOC）	テストケース数	不具合件数(予)
1	ページ作成	CMS101	お知らせリスト	200	20	2
2		CMS102	お知らせ登録	300	30	4
3		CMS103	お知らせ編集	300	30	4
4		CMS111	TOPスライド	400	40	5
5		CMS121	首長から	400	40	5
6		CMS131	自治体について	400	40	5
7		CMS141	個人情報保護方針	150	15	2
8		CMS151	特定商取引法	250	25	3
9		CMS161	情報セキュリティ方針	200	20	2
10		CMS171	利用規約	150	15	2
11		CMS181	サイトポリシー	150	15	2

品質計画は、以下の3つの主要指標に基づいて算出されます。

1. コード行数（LOC）－システム規模の指標
2. テストケース数－品質保証の精度向上
3. 予想バグ件数－事前のリスク管理（UT・ITバグ数を下回る目標）

品質管理（開発）

開発プロセスにおいて、品質保証（QA）部門は、実際の品質データを測定し、計画されたデータと比較することで、製品の品質を確保します。目標を達成できない場合、テストケースを追加したり、レビュー活動を増やしたり、テストを強化するなどの改善策として実施しています。





品質管理（開発）

☐	#	Project	Tracker	Status	Priority	Subject	Assignee	Author	Start date	Due date	% Done	Screen ID	
☐	#170188	MISEREJI_P2	Bug	New	= Normal	Sprint6 POSレジタブレット版の修正依頼 (Yêu cầu chỉnh sửa POS ở Sprint06) (1)	HaoNV	QuyenVTH	2025-02-06	2025-02-14		Common	***
☐	#170083	MISEREJI_P2	Bug	New	= Normal	[P67] Không scroll xem danh sách mua hàng của khách hàng được	HungBT	YenLTH	2025-02-05	2025-02-12		P67	***
☐	#170065	MISEREJI_P2	Bug	Canceled	= Normal	[P67] Không hiển thị thông tin đơn hàng của khách hàng (1)	HungBT	YenLTH	2025-02-05	2025-02-12		P58	***
☐	#170061	MISEREJI_P2	Bug	New	= Normal	[P58] Button [ドアを開ける] không hoạt động	HungBT	YenLTH	2025-02-05	2025-02-12		P58	***
☐	#170058	MISEREJI_P2	Bug	New	= Normal	[P56] Button [ドアを開ける] không hoạt động	HungBT	YenLTH	2025-02-05	2025-02-12		P56	***
☐	#170056	MISEREJI_P2	Bug	New	= Normal	[P55] Button [ドアを開ける] không hoạt động (1)	HungBT	YenLTH	2025-02-05	2025-02-12		P55	***
☐	#169228	MISEREJI_P2	Bug	Closed	= Normal	[M3] Kiểm trị hiển thị của cột [月] (2)	QuyenVTH	QuyenVTH	2025-02-03	2025-02-05			***
☐	#169214	MISEREJI_P2	Bug	Closed	⚡ High	[M3] Kiểm tra phân quyền (3)	QuyenVTH	QuyenVTH	2025-02-03	2025-02-04			***
☐	#169209	MISEREJI_P2	Bug	Closed	= Normal	[M3] Kiểm tra chức năng của button [엑스포트] (2)	QuyenVTH	QuyenVTH	2025-02-03	2025-02-05		M3	***
☐	#169034	MISEREJI_P2	Bug	Closed	= Normal	[M3] Sai giá trị mặc định khi dropdown [対象期間] chọn option [月次] (3)	QuyenVTH	QuyenVTH	2025-01-24	2025-01-24			***

①不具合の管理

すべての不具合は、測定可能な形で社内の管理システムに記録されます。

②画面単位でのマッピング

測定を容易にするため、バグは発生した画面ごとにマッピングされ、どの画面で問題が発生しているかが明確になります。

品質管理（開発）

品質状況・品質見解

■ 開発時

#	Screen ID	Group name	Screen Name	Flutter	Webview	Estimate LOC[Ks]	Actual LOC[Ks]	density[%] (Ac / Es)	SKG Test						
									Check List				Bugs		
									Target Plan(件)	Actual(件)	density (件/Ks)	evaluation (○△×)	Target Plan(件)	Actual(件)	density (件/Ks)
1	B_LGN_100	ログイン	ログイン画面	○		0.03	0.90	2733.33%	72	99	109.8	○	7	17	18.8
2	B_LGN_110		生体認証によるログイン	○		0.3	0.77	257.33%	62	14	18.1	×	6	4	5.2
3	B_LGN_120		確認コードを入力	○		0.2	0.58	288.50%	46	38	65.9	○	5	8	13.9
								100%	26	10	30.3	×	3	4	12.1
									41	22	43.4	○	4	3	5.9
9	B_PFU_200		ステップ2 アカウント登録		○										
10	B_PFU_300		ステップ3 確認コード入力		○										

品質管理システムに記録されたバグの数に基づいて、QA部門は日々測定を行い、その結果を隣の画像のように品質レポートとしてまとめます。テストフェーズ以降は、毎週定例会議で品質状況を報告し、進捗と改善点を共有します。

品質管理（分析）




品質管理（分析）

#	ID	問題点 / problems	発生当初の対応 / Response at the time of occurrence	今後の対策（フィードバック） / Future measures (feedback)
1	A001	①API情報と設計資料が不足 ②業務ロジック調査時間がかかる	① https://stg.mypg.jp ページの動きとものネイティブソースコードをベースで業務ロジックを確認 ② プログラムデザインを英語で作成した（コーディング・テストに時間が多くかからないために、API呼び出しの情報を含めてアプリの基本ロジックを記載した。） ③ AAA様に資料確認・フィードバックしていただき、資料を更新する。（保守に利用可）	【AAA様】 ① 案件に関する資料があれば、すべて共有いただいております。 【SKG】 ① どの画面でどのAPIを呼び出すか洗い出すマッピング表を作成する。 ② 案件のスケジュールを立てる工程では、APIの確認時間をバッファとして見積りする。
2	A002	https://stg.mypg.jp で確認する際に、新規画面が複数発見した（見積りが甘かった） 見積り：86画面 実際：110画面	新規画面があるときに、各画面が期間通りできるようにSKGで評価・見積り作成・タスク作成・リスクを行う。	

分析結果に基づいて、次回の改善策を提案し、その後、私たちとお客様は反省会を開き、今後の課題や改善点について相談を行います。


品質管理（改善）

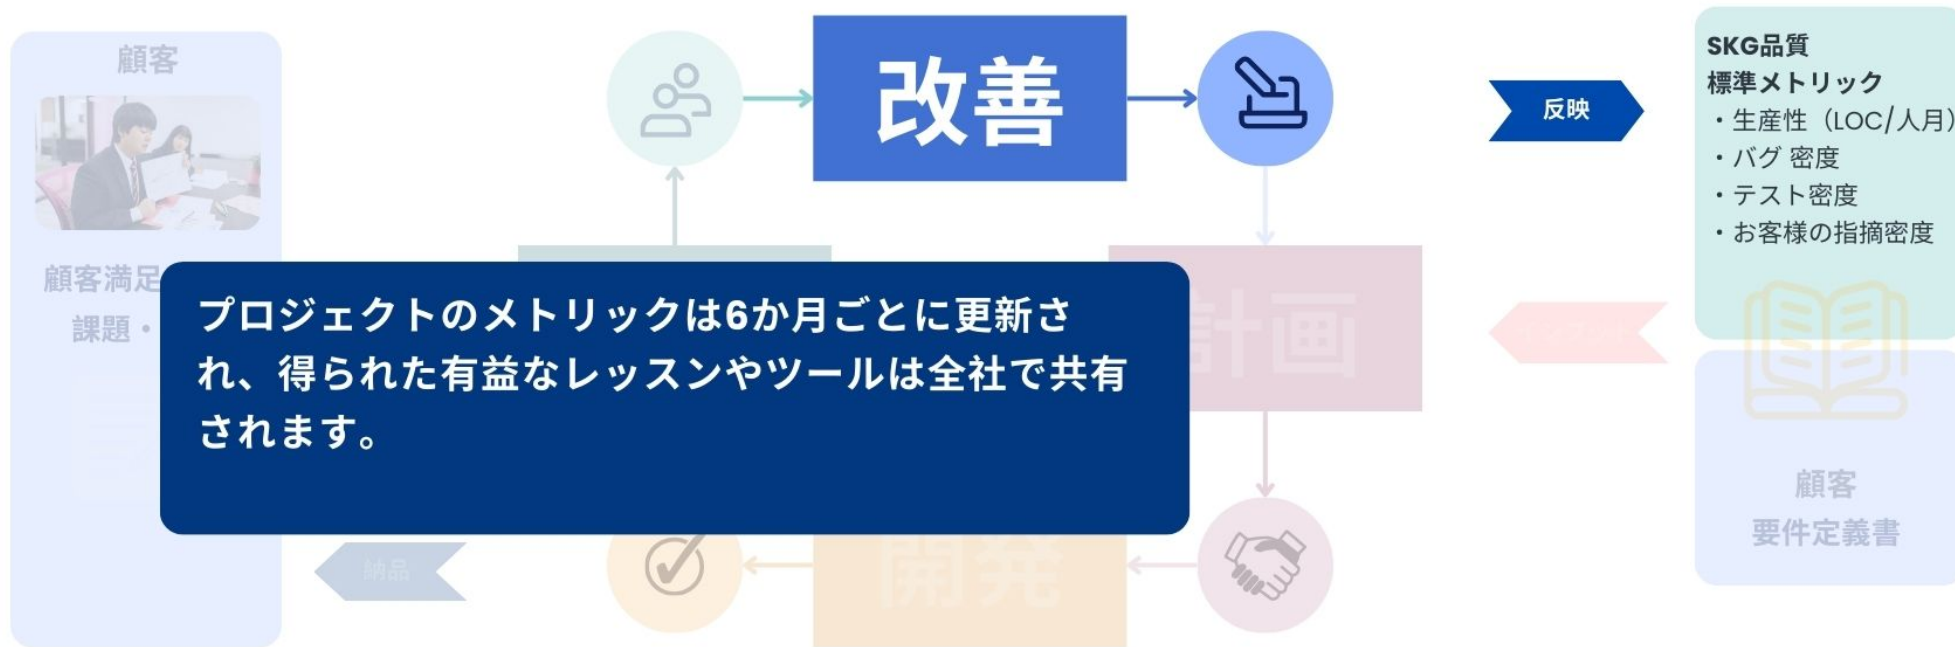

プロジェクト管理



プロジェクト管理モデル

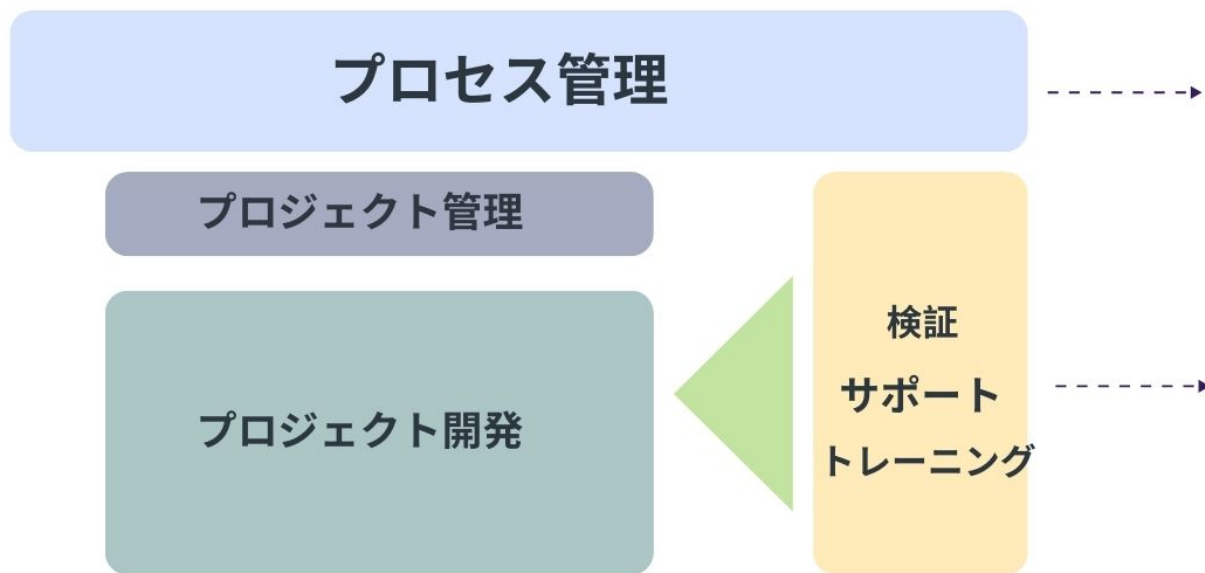

①会社レベル

会社はすべてのプロジェクトに対して、事前にプロジェクト管理プロセスを定義します。

③サポートチーム

サポート部門は、プロジェクトが会社のプロセスに従って進行していることを確認するために監査を実施するとともに、社員の能力向上を目的としたトレーニングも行います。

②プロジェクトレベル

既存のプロセスに基づいて、プロジェクトはすべてのプロセスを適用するか、顧客の特性と要求に応じてカスタマイズすることができます。

プロジェクト管理モデル

管理項目	説明
依頼内容と仕様変更管理	依頼内容とは要件定義書か基本設計書か詳細設計書です。 仕様変更は依頼内容の変更です。
プロジェクト計画	マスタースケジュール 明細作業 詳細スケジュール 体制 ルールと規則 テンプレートとサンプル コミュニケーションチャンネル
進捗管理	日報 週報 品質状況
構成管理	環境、端末、Thirtparty管理
リスク・課題管理	

依頼内容と仕様変更管理

明細作業管理表

#	Priority	課題	担当者	% Done	開始日(予定)	完了日(予定)	開始日(実績)	完了日(実績)
178	Normal	[Ver.0.1][コーディング] 検索条件画面のナビゲーションバーがページの背景色と重なってしまい	QuyettND		2024年3月11日	2024年3月12日		
179	Normal	[Ver.0.1][コーディング] 退会(終了)	BaoNBQ		2024年3月6日	2024年3月8日		
180	Normal	[Ver.0.1][コーディング] 分析 (アナライズ)	LongNH		2024年3月14日	2024年3月19日		
181	High	[Ver.0.1][コーディング] お知らせフォーム (notice-form)	BaoNBQ		2024年3月20日	2024年3月22日		
182	Normal	[Ver.0.1][コーディング] 問合せフォーム (お問い合せフォーム)	BaoNBQ		2024年3月15日	2024年3月19日		
183	Normal	[Ver.0.1][コーディング] フックマーク (しおり)	LongNH		2024年3月20日	2024年3月22日		
184	High	[Ver.0.1][コーディング] 画像動画(アセット)	QuyettND		2024年3月14日	2024年3月19日		
185	High	[Ver.0.1][コーディング] 結果詳細 (result-detail)	QuyettND		2024年3月11日	2024年3月13日		
186	Normal	[Ver.0.1][コーディング] 検索結果 (search-result)	LongNH		2024年3月5日	2024年3月8日		
187	High	[Ver.0.1][ドキュメント] 検索結果 (search-result)	QuyettND		2024年2月29日	2024年3月1日		
188	Normal	[Ver.0.1][コーディング] 検索条件 (search-condition)	LongNH		2024年2月28日	2024年3月4日		
189	Normal	[Ver.0.1][コーディング] マイページ (mypage)	QuyettND		2024年3月11日	2024年3月14日		
190	Normal	[Ver.0.1][コーディング] ログイン (login)	BaoNBQ		2024年3月14日	2024年3月18日		
191	Low	[Ver.0.1][コーディング] リンク確認/登録 (link)	BaoNBQ		2024年3月11日	2024年3月12日		
192	Normal	[Ver.0.1][コーディング] 登録/更新 (entry-update)	BaoNBQ		2024年3月5日	2024年3月8日		
193	Low	[Ver.0.1][ドキュメント] 登録/更新 (entry-update)	QuyettND		2024年2月29日	2024年2月29日		
194	Normal	[Ver.0.1][CreateTC] 仮登録 (regist)	QuyettND		2024年2月29日	2024年2月29日		
195	Normal	[Ver.0.1][ドキュメント] 仮登録 (regist)	QuyettND		2024年2月29日	2024年2月29日		
196	Normal	[Ver.0.1][コーディング] 募集/仮登録 (regist)	BaoNBQ		2024年2月27日	2024年3月4日		
197	Normal	[セットアップ] サービスメールのセットアップ	BaoNBQ		2024年2月21日	2024年2月21日		
198	Low	[Ver.0.1]Screenポータルサイト用デスクトップ作成	QuyettND		2024年2月29日	2024年3月1日		
199	Low	カスタマーサポートを提供してください	Kuroiwa		2024年2月20日	2024年2月27日		
200	Low	ガイドライン/ガイドライン作成 サーパーへのデフォイテ	QuyettND		2024年2月20日	2024年3月5日		
201	Low	[Ver.0.1][CreateTC] ポータルサイト (サンプル)	QuyettND		2024年2月20日	2024年3月1日		
202	Low	[Ver.0.1][ドキュメント] ポータルサイト (サンプル)	QuyettND		2024年2月26日	2024年2月28日		
203	Low	[Ver.0.1][コーディング] ポータルサイト	BaoNBQ		2024年2月23日	2024年2月27日		
204	Normal	[Ver.0.1][コーディング] 共通フッター	BaoNBQ		2024年2月22日	2024年2月22日		
205	Normal	[Ver.0.1][コーディング] 共通ヘッダー	BaoNBQ		2024年2月21日	2024年2月21日		
206	Low	[コーディング] 各ユーザーの役割に応じて画面を移動できるように全画面 (画面名とボタンのみ)	QuyettND		2024年2月21日	2024年2月23日		
207	Low	[学習] 環境を構築し、ソースコードを学習して実行する	QuyettND		2024年2月20日	2024年2月20日		
208	Low	[学習] 環境を構築し、ソースコードを学習して実行する	BaoNBQ		2024年2月20日	2024年2月20日		
209	Low	(共通) - 日次・週次・課題会議 / (一般) - 日次・週・課題の会議	QuyettND		2024年2月20日	2024年2月29日		

私たちは、顧客の要件を管理するために、それらを24時間以内（平均して8～16時間）のタスクに分割します。顧客と合意した後、すべてのタスクを会社のタスク管理Webサイトにアップロードし、プロジェクトと顧客と一緒に管理できます。

☐	#17337	fcmp	Task	Closed	=	Normal	[Ver.0.1][Coding] 退会 (termination)	BaoNBQ	QuyettND	2024-03-06	2024-03-08		S15	...
☐	#17333	fcmp	Task	Closed	=	Normal	[Ver.0.1][Coding] 分析 (analyse)	LongNH	QuyettND	2024-03-14	2024-03-19		S14	...
☐	#17329	fcmp	Task	Closed	=	Normal	[Ver.0.1][Coding] お知らせフォーム (notice-form)	BaoNBQ	QuyettND	2024-03-20	2024-03-22		S13	...
☐	#17325	fcmp	Task	Closed	=	Normal	[Ver.0.1][Coding] 問合せフォーム (inquiry-form)	BaoNBQ	QuyettND	2024-03-15	2024-03-19		S11	...
☐	#17321	fcmp	Task	Closed	=	Normal	[Ver.0.1][Coding] フックマーク (bookmark)	LongNH	QuyettND	2024-03-20	2024-03-22		S10	...
☐	#17317	fcmp	Task	Closed	=	Normal	[Ver.0.1][Coding] 画像動画 (asset)	QuyettND	QuyettND	2024-03-14	2024-03-19		S9	...
☐	#17313	fcmp	Task	Closed	=	Normal	[Ver.0.1][Coding] 結果詳細 (result-detail)	QuyettND	QuyettND	2024-03-11	2024-03-13		S8	...
☐	#17309	fcmp	Task	Closed	=	Normal	[Ver.0.1][Coding] 検索結果 (search-result)	LongNH	QuyettND	2024-03-05	2024-03-08		S7	...
☐	#17308	fcmp	Task	Canceled	=	Normal	[Ver.0.1][Document] 検索結果 (search-result)	QuyettND	QuyettND	2024-02-29	2024-03-01		S7	...
☐	#17305	fcmp	Task	Closed	=	Normal	[Ver.0.1][Coding] 検索条件 (search-condition)	LongNH	QuyettND	2024-02-28	2024-03-04		S6	...
☐	#17301	fcmp	Task	Closed	=	Normal	[Ver.0.1][Coding] マイページ (mypage)	QuyettND	QuyettND	2024-03-11	2024-03-14		S5	...
☐	#17297	fcmp	Task	Closed	=	Normal	[Ver.0.1][Coding] ログイン (login)	BaoNBQ	QuyettND	2024-03-14	2024-03-18		D1	...
☐	#17285	fcmp	Task	Closed	=	Normal	[Ver.0.1][Coding] リンク確認/登録 (link)	BaoNBQ	QuyettND	2024-03-11	2024-03-12		S4	...
☐	#17281	fcmp	Task	Closed	=	Normal	[Ver.0.1][Coding] 登録/更新 (entry-update)	BaoNBQ	QuyettND	2024-03-05	2024-03-08		S3	...
☐	#17280	fcmp	Task	Canceled	=	Normal	[Ver.0.1][Document] 登録/更新 (entry-update)	QuyettND	QuyettND	2024-02-29	2024-02-29		S3	...

依頼内容と仕様変更管理

管理システム（Redmineからカスタマイズされたもの）には、変更要求、要件、タスクなどが分かれており、管理が便利で簡単です。

☒ Status
☒ Tracker

> Options

☐	#	Project	Tracker	Status	Severity	Priority	Subject	Assignee	Author	Start date	Due date	% Done	Screen ID
☐	16442	memoria	CR	Closed	Major	High	Tạo/Lưu Customer	DuyVH	ThinhNLP	2023-08-01	2023-08-03		
☐	16254	memoria	CR	Closed	Major	Normal	Nội dung sửa sau khi demo ngày 19/7	SonNT	SonNT	2023-07-19			
☐	16219	memoria	CR	Closed	Critical	Normal	Compare database migration and database local	SonNT	SonNT	2023-07-17			
☐	16199	memoria	CR	Closed	Minor	Normal	Viet 1 tool đọc dữ liệu từ googlesheet rồi generate ra section_management master data được ko	ThinhNLP	SonNT	2023-07-17			
☐	16062	memoria	CR	Closed	Major	Normal	Thay đổi màu sắc khi đăng ký dữ liệu	SonNT	SonNT	2023-07-07			
☐	15983	memoria	CR	Closed	Minor	Normal	Khi đăng ký xong thì người localstaff và staff ko biết nội dung đã đăng ký cho KH cái gì -> Khi click vào customer thì hiện thì ra màn hình detail như bên cho Customer được ko? (Làm common cho cả 2 account Headquarter và Localstaff	SonNT	SonNT	2023-07-04			
☐	15882	memoria	CR	Closed	Minor	Normal	Về việc confirm tiền	SonNT	SonNT	2023-06-29			
☐	15539	memoria	CR	Closed	Minor	Normal	Update lại màn hình 字形依頼	DuyVH	SonNT	2023-06-14	2023-06-16		
☐	14472	memoria	CR	Closed	Minor	Low	[Layout] Chính sửa phầ n hiệu ứng camera	DuyVH	ThinhNLP	2023-05-16	2023-06-15		
☐	14470	memoria	CR	Closed	Major	Normal	[Layout] Tạo hiệu ứng stripped table cho các màn hình list	ThanhDV	ThinhNLP	2023-05-16	2023-05-19		

プロジェクト計画

プロジェクト計画



①プロジェクトの定義

システム構成とプロジェクト概要と
チームの作業範囲と技術など



②インプット・アウトプット

プロジェクトのインプットと提供日程
または言語（日本語、英語など）



③プロジェクト管理方法

コミュニケーションと成果物管理と
品質管理の明確



④体制と役割分担

工程ごとにタスクに割合明確



⑤納品一覧とマスタスケジュール

納品物一覧とマスタスケジュール明確

顧客が見積もりを承認した後、正式にプロジェクトを開始する前に、通常1週間以内でExcel形式のプロジェクト計画を作成します。

Item ID	Type	Status	Priority	Category	Assignee	Due Date	Completion Date
#17337	fcmp	Task	Closed	Normal	[Ver.0.1][Coding] 退会 (termination)	BaoNQ8	QuyetND 2024-03-06 2024-03-08
#17333	fcmp	Task	Closed	Normal	[Ver.0.1][Coding] 分析 (analyse)	LongNH	QuyetND 2024-03-14 2024-03-19
#17329	fcmp	Task	Closed	Normal	[Ver.0.1][Coding] お知らせフォーム (notice-form)	BaoNQ8	QuyetND 2024-03-20 2024-03-22
#17325	fcmp	Task	Closed	Normal	[Ver.0.1][Coding] 問合せフォーム (inquiry-form)	BaoNQ8	QuyetND 2024-03-15 2024-03-19
#17321	fcmp	Task	Closed	Normal	[Ver.0.1][Coding] フックマーク (bookmark)	LongNH	QuyetND 2024-03-20 2024-03-22
#17317	fcmp	Task	Closed	Normal	[Ver.0.1][Coding] 画像動画 (asset)	QuyetND	QuyetND 2024-03-14 2024-03-19
#17313	fcmp	Task	Closed	Normal	[Ver.0.1][Coding] 結果詳細 (result-detail)	Quy	
#17309	fcmp	Task	Closed	Normal	[Ver.0.1][Coding] 検索結果 (search-result)	Long	
#17308	fcmp	Task	Canceled	Normal	[Ver.0.1][Document] 検索結果 (search-result)	Quy	
#17305	fcmp	Task	Closed	Normal	[Ver.0.1][Coding] 検索条件 (search-condition)	Long	
#17301	fcmp	Task	Closed	Normal	[Ver.0.1][Coding] マイページ (mypage)	Quy	
#17297	fcmp	Task	Closed	Normal	[Ver.0.1][Coding] ログイン (login)	Bao	
#17285	fcmp	Task	Closed	Normal	[Ver.0.1][Coding] リンク確認/登録 (link)	Bao	
#17281	fcmp	Task	Closed	Normal	[Ver.0.1][Coding] 登録/更新 (entry-update)	Bao	
#17280	fcmp	Task	Canceled	Normal	[Ver.0.1][Document] 登録/更新 (entry-update)	Quy	

- QA-Task #13326 : [QA][PCV][memoria] - Tasklist open the project
- Q&A #13466 : QA về` lưu trữ thông tin khách lên bia mộ
- Q&A #13474 : 03.DB設計についてのQA。
- Task #13517 : [CD][AD_06]在庫一覧-在庫一覧（販売状況図、在庫...
- Task #13548 : [CD][AD_08]請求書（寺院）
- Task #13556 : [CD][AD_14]入金管理台帳-入金管理台帳（詳細）
- Q&A #13672 : Q&A về` logic
- Q&A #13713 : 本人確認書類について
- Q&A #13717 : 本人確認書類 1 ボタンと本人確認書類 2 ボタンについて
- QA-Task #13780 : Q&A về` layout
- Q&A #14085 : スタッフの営業管理台帳画面に表示される情報について...
- Q&A #14087 : メモリアルの契約情報画面について（yác nhân màn hình



進捗管理

本日（1月31日）の業務進捗についてご報告いたします。

※対応した業務の詳細

- Child Moodle の機能を完了しました。
- 現在、Parent Moodle におけるコースのダウンロード、アップロード、削除機能を実装中で、本日中に完了予定です。
- 2月1日にテストとバグ修正を行います。
- 2月2日に確認いただけるように環境へ反映いたします。

以上、ご報告申し上げます。


どうぞよろしくお願いいたします。

Image.png ▼



Course ID	Course Name	Client	Status
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000
00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000

お客様が当社のウェブサイトで直接進捗を確認できるだけでなく、私たちは日々の業務状況を報告します

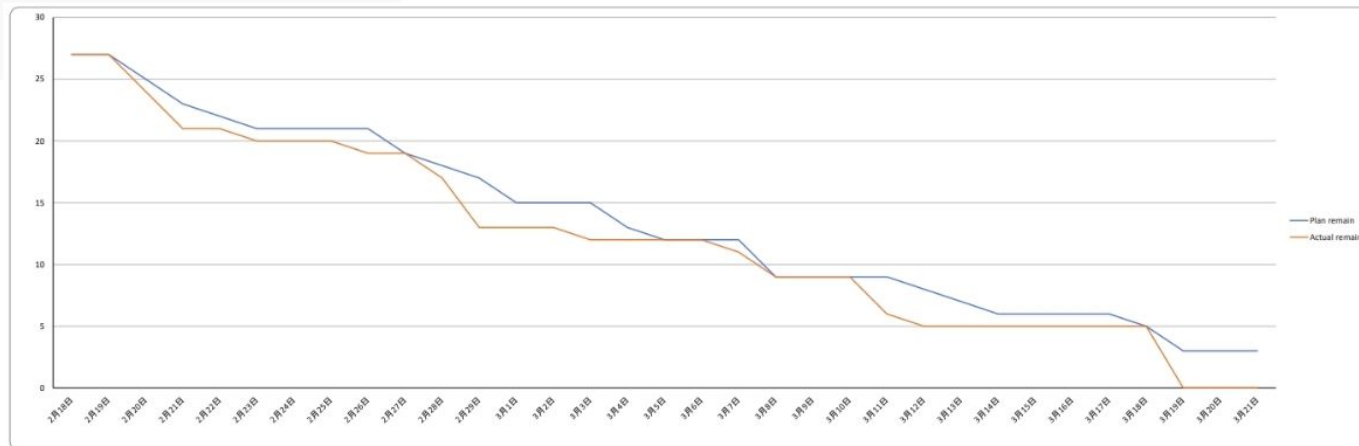

進捗管理（定例会議）



毎週、お客様とオンライン会議を開催し、プロジェクトの進捗状況を報告し、発生した問題を共有します。

2. 全体の進捗状況

2/3時点の状況を報告いたします。

2.1 サイトページ様の進捗（フィードバック）詳細

A. CHS

① 不適合 39 / 39 完了/実数
② 仕様変更 / 考慮不足 67 / 70 修正済/未修正数
③ 保留中 1

#	No	内容	Spss	SSC	参考
1	370	商品画像一括登録機能の追加	完了	完了	
2	378	商品ページ (2) ~ (4) で選択した商品も、コメント内で取り扱えるようにする ※フィードバックが必須となりますので、対応方法を検討いたします。	保留中	-	既存のタイプラベルを使ってソースコードに埋め込んでいる。実装しそうなタイプラベルをまとめた後、共有する。
3	379	「購入金額」「売上金額」「販売金額」「在庫数」「購入回数」「売上」「広告費の集計」上記の項目を全数でも入力できるように、以下の仕様になります。対応は可能でしょうか？ ※角数字、半角数字のみを入力できるようにする ※入力欄からフォーマットが判別できるように、半角数字に制限し、入力できないようにする	完了	完了	
4	383	以下の項目でも全角で入力できるようにする。 + 店舗名 + 購入回数 + 販売金額 (購入金額) + 仕入付金額 ※注: No.378/382/383の対応も行う	完了	完了	
5	384	毎日、メール送付時に departmentname 及び SKG としてメールを送っています。 この画面からメールを送る際に、Email にも送信するように変更してください。	完了	完了	
6	385	毎日、送付対象メールの件名は、[mgmt_department_name_title] の形式で送信しています。 この画面からメールの件名は、[mgmt_department_name_title] の形式で送信するように変更してください。	完了	SSCレビュー中	
7	387	<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.3.1/css/all.css"> が使用されている ※注: CSSのみの更新を行うと、外部を参照しないように行っていますが、読み込みされている	完了	完了	
8	388	以下を修正し、いかに変更する + 店舗、店舗状況 + 店舗利用状況	完了	2/7/2024修正予定	No.389に開いているのでNo.389の対応が完了次第それとともに対応を提出

構成管理



私たちはリスクと課題を社内管理システムで管理し、毎週エクセル形式でお客様に状況を報告します。

	#ID	Project	Tracker	Status	Severity	Priority	Subject	Assignee	Author	Start date	Due date	
☐	#17457	fcmp	Issue	Pending	Normal	Normal	chỉnh sửa socket, sử dụng loading lazy để tối ưu performance	LongNH	QuyetND	2024-04-16	2024-04-16	
☐	#17444	fcmp	Issue	Closed	Normal	Normal	Giảm chất lượng của user icon	BaoNQB	QuyetND	2024-04-09	2024-04-09	

Also available in: Atom CSV PDF

② 仕様変更 / 考慮不足 67 / 70 修正済 / 全編出数
③ 保線中 1

#	No.	内容	Spdx	SSC	参考
1	370	商品情報一括登録機能の追加	完了	完了	
2	378	商品プロダクト（2）～（4）で選択した商品も、コンポーネント内で呼び取えができればよいとする →タイプの変更が必要と思われるので、対応方法を検討したと記録されている。	保留中	-	既出のタイプ名を使ってクラスコードと取り込んでいる。実際は、そのタイプが変更されたら既出する。
3	379	「購入金額」「購入金額」「取得金額」「購入金額」「購入金額」「購入金額」 上記の項目を共有でも入力できるように、以下の対応したいです。対応は可能でしょうか？ ・半角数字、全角数字のみ入力できるようにする。 →入力欄のフォーマットを設定する。半角数字に限定し、カンマを付する。	完了	完了	
4	383	以下の項目でも共有でも入力できるようにする。 ・伝票番号 ・購入金額 ・取得金額（購入金額） →レインの伝票 ※注：No.379/382/同様の対応あり	完了	完了	
5	384	領収、メール送信部（departmentNameのIDをBCCとしてメールを送っているが、 この画面からIDをBCCとしてEmailに送信するように変更して欲しい。	完了	完了	
6	385	領収、送信されたメールの件名の「mgmt_department_id_5589」が423がずれている。 この画面からIDをメールの件名に、サブジェクト「mgmt_department_id_5589」が423がずれているように変更して欲しい。	完了	SSCレビュー中	
7	387	<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.3.1/css/all.css"> が参照されている。 以前、CDNからの取得、実行上は外部を参照しないようにしてはほしいが、現在も参照している	完了	完了	
8	388	以下の参照先をいかに変更する お問、お問の状況 →お問の状況	完了	2/3/24に修正作業	No.389に類似しているためNo.389の対応が完了次第でも対応したと確認

セキュリティ 情報管理



セキュリティ情報管理



物理的対策:

- ① 入退室管理
- ② 監視カメラの設置
- ③ サーバー室の施錠

セキュリティ情報管理




SKG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
JOINT STOCK COMPANY

- Grades
- General
- Information Security Management System (ISMS) Concept
- ISMS ISO27001:2013 Management System
- Applying ISO 27001:2013 to software projects
- ISMS Lessons and Troubleshooting
- ISMS Comprehensive Test

Information Security Awareness and ISO 27001:2013

[Dashboard](#) / [My courses](#) / [ISMS](#)

- ☒ Periodic Information Security Test by Team S7 October 2024
- ☒ Periodic Test on Information Security according to ISO 27001:2013 May 2024
- ☒ Periodic Test on Information Security according to ISO 27001:2013 July 2022
- ☒ ISO 27001:2013 Information Security Periodic Test August 2021
- ☒ ISO 27001:2013 Information Security Periodic Test December 2021
- ☐ Lecture slides

組織的対策:

- ① 情報セキュリティポリシーの策定
- ② 情報セキュリティ教育の実施
- ③ 内部統制の強化

セキュリティ情報管理



SKG TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

Select Authentication Provider

LDAP / SKG USER

Administrator

Enter your credentials

Username

Password

Log In

Forgot your password?



技術的対策:

- ① ファイアウォールや侵入検知システムなどの導入
- ② アクセス制御の設定(Domain, VPN)
- ③ ウイルス対策ソフトの導入

**私たちは、お客様に最も手頃な
価格で最高のサービスを提供す
ることを約束します。**

 jpoffice@skg.com.vn

 <https://skg.com.vn>
<https://skg-japan.co.jp/>

 +84-28 3600 1900

